



پروپوزال طراحی توسعه استقرار و پشتیبانی سامانه جامع جت وام

پلتفرم تأمین مالی دیجیتال مدیریت درخواست تسهیلات پذیرندگان تراکنش و تسویه

مشخصات	مقدار
تهیه کننده	[نام شرکت پیشنهاددهنده]
کارفرما	[نام شرکت کارفرما]
نسخه و تاریخ	نسخه ۱ ۳ مهر ۱۴۰۵
اعتبار پیشنهاد	۳۰ روز تقویمی

این سند محرمانه است و صرفاً برای ارزیابی پیشنهاد و مذاکره قراردادی در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.

اطلاعات و کنترل سند

عنوان	مقدار
نام سند	پروپوزال طراحی توسعه استقرار و پشتیبانی سامانه جامع جت وام
مالک پیشنهاد	[نام شرکت پیشنهاددهنده]
مخاطب	[نام شرکت کارفرما]
نسخه	نسخه ۱
تاریخ	۳ مهر ۱۴۰۵
طبقه بندی	محرمانه
وضعیت	در انتظار تکمیل اطلاعات ثبتي طرفین

هدف سند

این پروپوزال محدوده پیشنهادی، معماری، روش اجرا، برنامه زمان‌بندی، مدل پشتیبانی و شرایط تجاری طراحی و راه‌اندازی نسخه عملیاتی سامانه جت وام را مشخص می‌کند. هدف، رسیدن به یک توافق قابل سنجش برای تولید و بهره‌برداری سامانه در محیط شرکت زیرمجموعه بانک است.

مبنای تدوین

- راهنمای فعلی سامانه و ویدئوی سفر مشتری به عنوان توصیف وضعیت جاری
- سند نیازمندی‌های جت وام به عنوان نقشه راه و نیازمندی‌های نسخه‌های آینده
- معماری و کد موجود پروژه شامل ماژول‌های هویت، محصول، درخواست، استعلام، پرداخت، پذیرنده، تراکنش و تسویه
- مذاکرات تکمیلی تحلیل کسب و کار و خروجی فاز شناخت که پس از شروع قرارداد نهایی می‌شود

فهرست مطالب

۱ خلاصه مدیریتی

۲ شناخت مسئله و اهداف

۳ محدوده پیشنهادی نسخه عملیاتی

۴ سفر مشتری و فرایندهای اصلی

۵ معماری راهکار

۶ امنیت و الزامات غیرعملکردی

۷ روش اجرا و برنامه زمان‌بندی

۸ تیم و حاکمیت پروژه

۹ تضمین کیفیت و پذیرش

۱۰ استقرار و بهره‌برداری

۱۱ پشتیبانی و سطح خدمت

۱۲ پیشنهاد مالی

۱۳ مفروضات و موارد خارج از محدوده

۱۴ ریسک‌ها و کنترل تغییرات

۱۵ شرایط قراردادی پیشنهادی

۱۶ گام‌های شروع پروژه

۱۷ پیوست الف تحویل‌دادنی‌ها

۱۸ پیوست ب فرهنگ واژگان

۱ خلاصه مدیریتی

پیشنهاد حاضر، طراحی و پیاده‌سازی یک پلتفرم تأمین مالی دیجیتال برای مدیریت چرخه درخواست تسهیلات، احراز هویت مشتری، کنترل‌های اعتباری، قرارداد و امضای دیجیتال، تخصیص اعتبار، مدیریت پذیرندگان و تسویه تراکنش‌ها را پوشش می‌دهد. راهکار به صورت ماژولار طراحی می‌شود تا افزودن محصول، طرح، کنترل یا سرویس‌دهنده بیرونی بدون بازنویسی هسته امکان‌پذیر باشد.

نسخه عملیاتی پیشنهادی در یک برنامه ۴۸ هفته‌ای تحویل می‌شود. شرایط تجاری در دو مدل قابل انتخاب ارائه شده است: پرداخت ثابت به مبلغ ۲۴/۵ میلیارد تومان یا همکاری مشارکتی مبتنی بر کارمزد با پرداخت بخشی از مبلغ اجرا، سهم کارمزدی و حداقل پرداخت تضمین‌شده. سه ماه ضمانت رفع اشکال پس از راه‌اندازی در هر دو مدل منظور شده و در مدل مشارکتی، پشتیبانی استاندارد از محل سهم کارمزدی و کف تضمین‌شده پوشش داده می‌شود.

پیشنهاد	موضوع
۴۸ هفته	مدت اجرای مبنا
۲۴/۵ میلیارد تومان	مبلغ اجرای پیشنهادی
۳ ماه پس از راه‌اندازی	دوره ضمانت
ماژولار مونولیت با مرزبندی دامنه	الگوی معماری پایه
محیط توسعه آزمون پذیرش و تولید	محیط‌های استقرار
۸ در ۵ یا ۲۴ در ۷	گزینه‌های پشتیبانی

تصمیم مورد درخواست

پیشنهاد می‌شود کارفرما ابتدا شروع فاز شناخت و تثبیت محدوده را تصویب کند. خروجی این فاز شامل فهرست نهایی فرایندها، API‌های بیرونی، معیارهای پذیرش، برنامه انتشار و نسخه نهایی برنامه هزینه خواهد بود. هر تعهد ثابت زمانی یا مالی برای قابلیت‌هایی که API یا مقررات آن‌ها هنوز مشخص نیست، پس از این فاز قطعی می‌شود.

۲ شناخت مسئله و اهداف

وضعیت کسب و کار

سامانه جت وام چرخه‌ای را مدیریت می‌کند که از ثبت‌نام مشتری و انتخاب طرح شروع می‌شود، با استعلام‌ها و کنترل‌های اعتباری ادامه پیدا می‌کند و پس از تکمیل مدارک، پرداخت هزینه‌ها و امضای قرارداد به تخصیص اعتبار می‌رسد. مصرف اعتبار در شبکه پذیرندگان انجام می‌شود و نتیجه تراکنش‌ها باید در فرایند تطبیق و تسویه مالی پذیرندگان منعکس شود.

اهداف نسخه عملیاتی

- یکپارچه‌سازی سفر مشتری از ثبت‌نام تا تخصیص و مصرف اعتبار
- تعریف محصول و طرح بدون وابستگی قواعد تجاری به کد هسته
- اجرای کنترل‌های اعتباری با اولویت و توقف در اولین عدم احراز
- مدیریت چند سرویس‌دهنده بیرونی با مسیریابی، TLS، failover، و احراز هویت قابل تنظیم
- مدیریت متمرکز پذیرنده، شعب، کاربران، ابزارهای پرداخت و قراردادهای
- ثبت قابل حسابرسی تراکنش‌ها، مغایرت‌ها و تسویه با پذیرندگان
- تفکیک نقش و مجوز برای مشتری، پذیرنده، عملیات، مالی و مدیر سیستم
- فراهم‌کردن زیرساخت توسعه بعدی کیف پول، BNPL، جت کارت و باشگاه مشتریان

شاخص‌های موفقیت پیشنهادی

شاخص	معیار پذیرش پیشنهادی
سفر درخواست	ثبت و پیگیری انتها به انتهای درخواست در محیط UAT
استعلام	ثبت تاریخچه، نتیجه و callback قابل بازیابی
کنترل هزینه	عدم اجرای کنترل و هزینه مرحله بعد پس از رد کنترل جاری
تراکنش	تطبیق روزانه با گزارش مغایرت و قابلیت اجرای مجدد
تسویه	محاسبه قابل تکرار و تأییدپذیر برای هر دوره
حسابرسی	ثبت Audit برای عملیات حساس و تغییر تنظیمات

۳ محدوده پیشنهادی نسخه عملیاتی

محدوده زیر نسخه قابل بهره‌برداری اولیه را تعریف می‌کند. قابلیت‌های نقشه راه تنها زمانی جزو تعهد این قرارداد هستند که در همین بخش یا پیوست نهایی محدوده ذکر شوند.

شرح	حوزه
هویت و دسترسی	ثبت‌نام مشتری با موبایل و OTP، شاهکار، کاربران پنل، نقش‌ها، مجوزها، ۲FA قابل تنظیم
پروفایل مشتری	اطلاعات هویتی، تماس، سکونت، شغلی، بانکی و نگهداری نسخه اطلاعات مصرف‌شده در درخواست
محصول و طرح	تعریف محصول، طرح، مبلغ، مدت، نرخ، کنترل، استعلام، هزینه، ضامن و وثیقه
درخواست تسهیلات	ایجاد درخواست، ادامه فرایند نیمه‌تمام، وضعیت‌ها، تاریخچه و عملیات پشتیبانی

شرح	حوزه
کنترل و استعلام	سن، رتبه اعتباری، چک برگشتی و سایر کنترل‌ها با اولویت، اجرای async و callback
پرداخت کارمزد	ایجاد تعهد هزینه، پرداخت امن، تأیید معتبر و جلوگیری از پرداخت هزینه مراحل لغوشده
ضمانت	اطلاعات ضامن، چک صیادی، وثیقه و کنترل تکمیل الزامات طرح
قرارداد	تولید نسخه قرارداد، بایگانی، ثبت رضایت و اتصال به سرویس امضای دیجیتال
تخصیص اعتبار	ارسال درخواست به سرویس بیرونی، پیگیری نتیجه، retry و ثبت شناسه مرجع

شرح	حوزه
پذیرنده	پذیرنده، شعبه، کاربر، حساب بانکی، قرارداد و ابزار پرداخت
تراکنش	دریافت فایل یا API تراکنش، یکتاسازی، تطبیق، برگشت و مغایرت
تسویه	تعریف چرخه، محاسبه سهم، تأیید مالی، ارسال تسویه و گزارش نتیجه
اعلان	پیامک و اعلان فرایندی با providerهای قابل جایگزینی و outbox
پنل مدیریت	مدیریت درخواست، تنظیمات، پذیرنده، عملیات مالی، jobها، گزارش و Audit


تفکیک وضعیت جاری و نقشه راه

نحوه برخورد در پیشنهاد	طبقه	نمونه قابلیت
------------------------	------	--------------

نمونه قابلیت	طبقه	نحوه برخورد در پیشنهاد
ثبت نام، درخواست، استعلام، قرارداد، تخصیص اعتبار، پذیرنده و تسویه	هسته	جزو محدوده نسخه عملیاتی
کیف پول، BNPL، بازپرداخت منعطف، وصول مطالبات و CRM	نقشه راه	آماده سازی معماری و قرارداد توسعه جداگانه
جت کارت، اتصال شتاب و شاپرک، دفتر کل جامع و Loyalty Platform	راهبردی	مطالعه و طراحی رابط آینده

۴ سفر مشتری و فرایندهای اصلی

CUSTOMER CREDIT JOURNEY

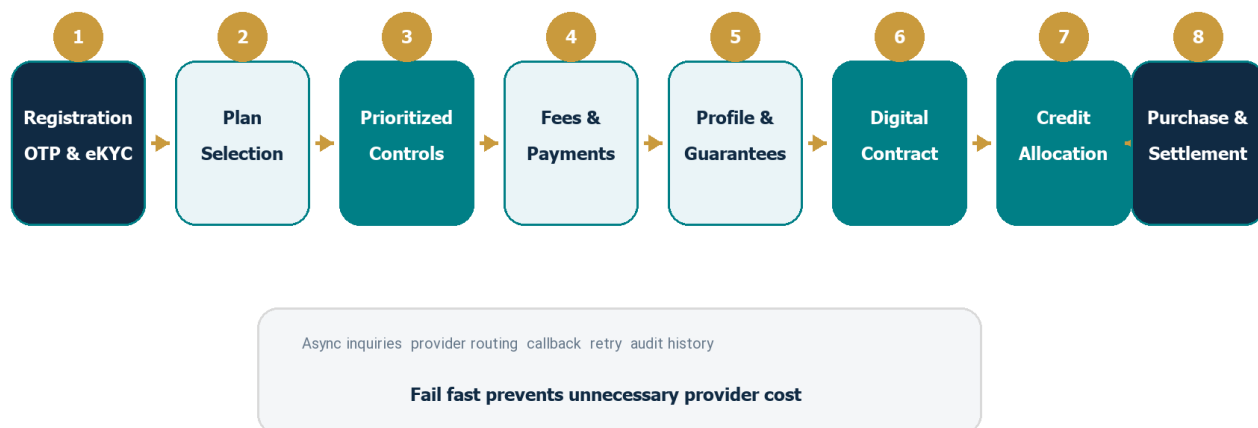

تصویر ۱ نمای سطح بالا از سفر مشتری تا تراکنش و تسویه

رفتار کنترل‌ها و استعلام‌ها

هنگام ایجاد درخواست، تمام کنترل‌های فعال طرح با وضعیت اولیه و اولویت مصوب در درخواست ثبت می‌شوند. کنترل محلی مانند سن همان لحظه ارزیابی می‌شود. اگر کنترل به استعلام بیرونی نیاز داشته باشد، هزینه همان کنترل فعال می‌شود و پس از پرداخت، درخواست استعلام به صورت پایدار ثبت خواهد شد.


Job مستقل درخواست را به provider ارسال یا نتیجه را با tracking code پیگیری می‌کند. Inquiry پس از رسیدن به نتیجه نهایی callback ثبت‌شده را فراخوانی می‌کند. Origination نتیجه را روی همان کنترل اعمال می‌کند و فقط در صورت موفقیت، کنترل بعدی آزاد می‌شود. رد یک کنترل، کنترل‌ها و هزینه‌های پرداخت‌نشده بعدی را لغو می‌کند.

سناریوهای مهم

- استعلام دو مرحله‌ای که در ارسال اولیه tracking code می‌دهد و نتیجه در polling بعدی دریافت می‌شود
- تعویض خودکار provider براساس سلامت، اولویت و سیاست مسیریابی تعریف‌شده
- اجرای مجدد امن job بدون ایجاد درخواست یا تراکنش تکراری
- ادامه درخواست مشتری از آخرین مرحله معتبر پس از خروج یا قطع ارتباط
- ورود پرونده به بررسی دستی پس از پایان retryهای خطای فنی

۵ معماری راهکار

JETVAM TARGET ARCHITECTURE

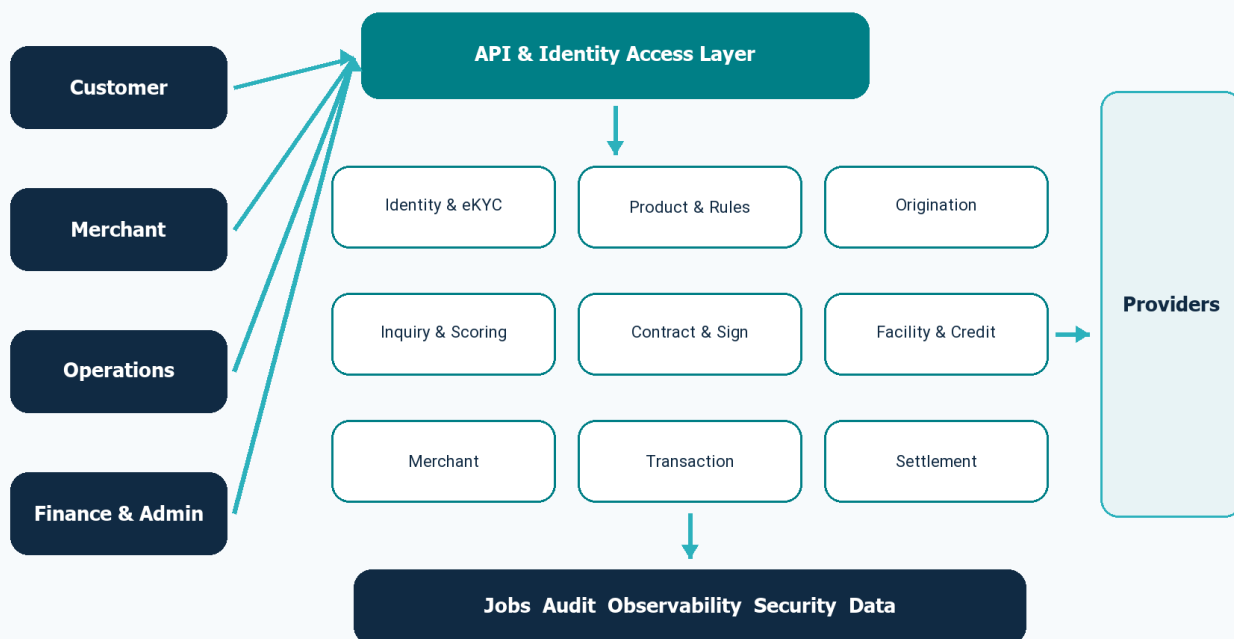

تصویر ۲ معماری هدف نسخه عملیاتی

الگوی معماری

نسخه اولیه به صورت modular monolith با مرزهای روشن دامنه پیاده می‌شود. این انتخاب هزینه عملیاتی و پیچیدگی توزیع‌شده را کنترل می‌کند، در عین حال قراردادهای ماژول‌ها و مالکیت داده به گونه‌ای تعریف می‌شوند که در صورت رشد بار یا تیم، جداسازی سرویس‌های منتخب ممکن باشد.

لايه	مسئولیت
Services Application	APIهای مشتری، پذیرنده و پنل‌های عملیاتی
UAA Application	OAuth2 و OTP، OIDC، کاربر، نقش و مجوز
Jobs Application	زمان‌بندی، اجرای دستی، retry و تاریخچه اجرا
Business Modules	هویت، محصول، درخواست، استعلام، پرداخت، قرارداد، پذیرنده و تسویه

مسئولیت	لایه
دیتابیس، Web و HTTP Client، TLS، Cache، Observability	Infrastructure
Routing چند provider و تنظیمات runtime بدون وابستگی به ماژول مصرف کننده	Integration

اصول یکپارچه سازی بیرونی

- Adapter اختصاصی هر capability در ماژول مالک همان کسب و کار قرار می گیرد
- Routing عمومی، سلامت provider، احراز هویت و TLS در زیرساخت Integration باقی می ماند
- تغییر endpoint، credential، certificate و اولویت provider از تنظیمات امن runtime انجام می شود
- فراخوانی شبکه داخل transaction دیتابیس انجام نمی شود
- تمام عملیات مالی و استعلامی دارای correlation id، idempotency key و Audit قابل جست و جو هستند

۶ امنیت و الزامات غیرعملکردی

امنیت و کنترل دسترسی

حوزه	کنترل پیشنهادی
احراز هویت	OIDC و OAuth2، توکن کوتاه‌عمر، refresh token کنترل‌شده و ابطال نشست
مجوزدهی	نقش به همراه مجوز جزئی و کنترل مالکیت مشتری یا محدوده پذیرنده
ارتباط امن	TLS برای همه ارتباطات و mTLS برای providerهایی که الزام دارند
مدیریت راز	Secret Manager یا Vault و ممنوعیت نگهداری credential در سورس
Audit	ثبت actor، زمان، عملیات، نتیجه و correlation id برای عملیات حساس
حفاظت داده	رمزنگاری داده حساس در انتقال و در صورت نیاز در سطح ستون یا دیسک
امنیت نرم‌افزار	Go dependency scan، SAST، تست نفوذ و رفع موارد بحرانی پیش از Go Live

اهداف غیرعملکردی


هدف	توضیح و شرط سنجش
۹۵٪ کمتر از ۳۰۰ میلی‌ثانیه	هدف SRS برای سرویس‌های داخل سامانه و بدون احتساب زمان provider بیرونی، پس از تثبیت سناریوی بار
دسترس‌پذیری ۹۹/۹۵ درصد	با معماری High Availability، مانیتورینگ و فرایند عملیاتی توافق‌شده

هدف	توضیح و شرط سنجش
ظرفیت	پشتیبانی از رشد تا ۵۰۰ هزار کاربر فعال و ۲۰۰ کاربر همزمان براساس الگوی بار مورد توافق
تداوم خدمت	پشتیبان‌گیری رمزگذاری‌شده، تست بازیابی و اهداف RPO و RTO مصوب کارفرما
مشاهده‌پذیری	Metrics، Trace، Log ساخت‌یافته، dashboard و alert برای جریان‌های اصلی

تحقق اعداد فوق وابسته به ظرفیت زیرساخت، کیفیت شبکه، رفتار providerها و داده واقعی آزمون است. معیار نهایی در سند Non Functional Requirements و برنامه آزمون کارایی تصویب می‌شود.

۷ روش اجرا و برنامه زمان بندی

DELIVERY ROADMAP 48 WEEKS

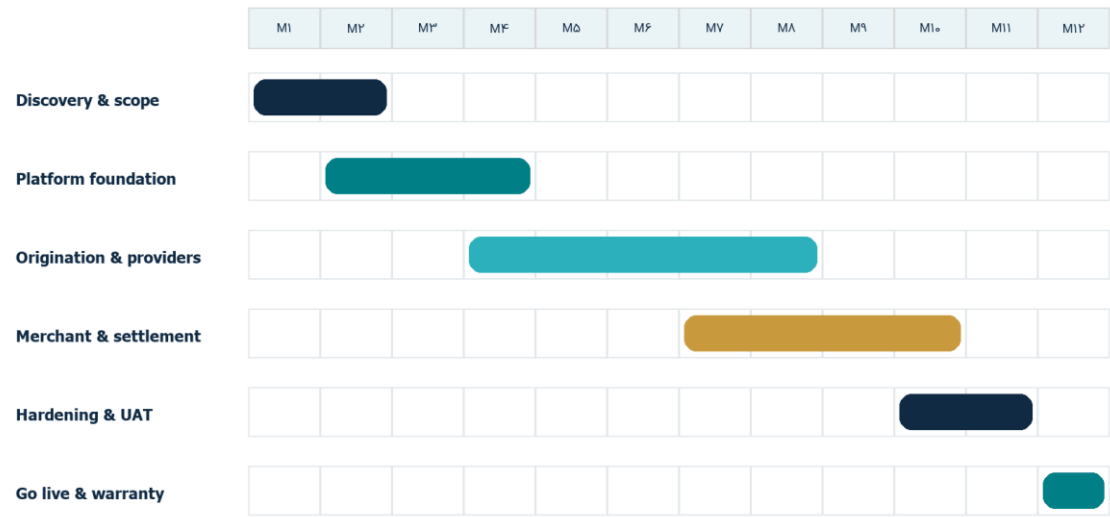

تصویر ۳ برنامه مبنای اجرای ۴۸ هفته‌ای با امکان هم‌پوشانی جریان‌ها

فاز	مدت	خروجی اصلی
شناخت و تثبیت محدوده	۴ تا ۶ هفته	Scope baseline، نقشه فرایند، NFR، API inventory و برنامه انتشار
زیرساخت پلتفرم	۸ تا ۱۰ هفته	UAA، امنیت، زیرساخت داده، Integration، CI/CD و Observability
هسته تسهیلات	۱۴ تا ۱۸ هفته	محصول و طرح، Origination، Inquiry، Payment، Contract و Guarantee
پذیرنده و مالی	۱۰ تا ۱۴ هفته	Settlement و Merchant، Transaction، Reconciliation
آماده‌سازی تولید	۸ هفته	کارایی، امنیت، UAT، مهاجرت، آموزش و Cutover
ضمانت پس از راه‌اندازی	۳ ماه	پایش نزدیک و رفع اشکال

چرخه تحویل

توسعه در iterationهای دو هفته‌ای انجام می‌شود. در پایان هر iteration، قابلیت تکمیل‌شده در محیط آزمون نمایش داده می‌شود. تصمیم‌های دامنه، تغییر Scope و وابستگی‌های provider در backlog و صورت‌جلسه کنترل تغییر ثبت می‌شوند. نسخه‌های قابل انتشار پس از عبور از تست خودکار، بازبینی امنیت و تأیید Product Owner به UAT منتقل خواهند شد.

۸ تیم و حاکمیت پروژه

ترکیب تیم پیشنهادی

نقش	ظرفیت مبنا	مسئولیت
معمار و Tech Lead	۱ نفر	مالک معماری، تصمیم‌های فنی و بازبینی کیفیت
تحلیلگر کسب و کار یا Product	۱ نفر	مدل‌سازی فرایند، backlog و معیار پذیرش
توسعه Backend	۳ تا ۴ نفر	ماژول‌های دامنه، API، داده و Integration
توسعه Frontend	۲ نفر	پرتال مشتری، پذیرنده و Backoffice
QA	۱ تا ۲ نفر	برنامه آزمون، Automation و UAT support
SRE و DevOps	نیم تا یک نفر	CI/CD، محیط‌ها، مانیتورینگ و امنیت استقرار
مدیر پروژه	نیم تا یک نفر	هماهنگی، گزارش پیشرفت، ریسک و صورت‌جلسه
کارشناس امنیت	پاره وقت یا پیمانکار	بازبینی امنیت و تست نفوذ

نقش‌های کارفرما

- معرفی Product Owner دارای اختیار تصمیم‌گیری درباره فرایند و اولویت
- معرفی نمایندگان عملیات، مالی، امنیت، زیرساخت و حقوقی
- تأمین دسترسی به محیط، API، مستندات provider و داده آزمون
- بررسی و اعلام نظر درباره تحویل‌ها در بازه زمانی توافق‌شده
- هماهنگی مجوزها، قراردادهای سرویس‌دهندگان و تأییدهای سازمانی

جلسات و گزارش‌ها

جلسه	تناوب	خروجی
Sprint Planning	هر دو هفته	برنامه iteration و تعهد دو هفته
Demo	هر دو هفته	نمایش قابلیت و ثبت بازخورد
گزارش مدیریت پروژه	هفتگی	وضعیت زمان هزینه ریسک و تصمیم
کمیته راهبری	ماهانه	تصمیم Scope و ریسک‌های سطح بالا
Change Control Board	حسب نیاز	تأیید تغییر و اثر زمان و مبلغ

۹ تضمین کیفیت و پذیرش

لایه‌های آزمون

- Unit Test برای قواعد دامنه، state machine و محاسبات مالی
- Integration Test برای دیتابیس، callback، migration و idempotency
- Contract Test برای API‌های provider و پاسخ‌های خطا
- End to End Test برای سفرهای مشتری، عملیات و پذیرنده
- Performance Test براساس workload مصوب و تفکیک زمان provider
- Security Test شامل dependency scan، SAST، تست دسترسی و تست نفوذ
- UAT با سناریو، داده و نتیجه مورد انتظار تأییدشده توسط کارفرما

معیار پذیرش هر قابلیت

معیار	مدرک پذیرش
نیازمندی مصوب	Traceability بین نیازمندی و story
موفقیت تست خودکار	گزارش pipeline و test suite
نبود آسیب‌پذیری Critical و High باز	خروجی بررسی امنیت
مستندات	نسخه API و راهنمای عملیاتی
تأیید Product Owner	صورجلسه Demo یا UAT
آمادگی انتشار	ثبت rollback plan و release note

پذیرش نهایی

پس از استقرار Production، یک دوره پایش اولیه برای اجرای سناریوهای حیاتی برگزار می‌شود. کارفرما حداکثر ده روز کاری برای اعلام مغایرت مستند با معیار پذیرش فرصت دارد. عدم اعلام مغایرت در این بازه به معنی پذیرش همان تحویل است؛ ایرادهای دوره ضمانت طبق اولویت رفع خواهند شد.

۱۰ استقرار و بهره‌برداری

محیط‌ها

کاربرد	محیط
توسعه و تست روزانه تیم	Development
تست یکپارچه و تست خودکار	Test
آزمون پذیرش با داده کنترل‌شده	UAT
خدمت واقعی با کنترل تغییر	Production
در صورت الزام HA و DR کارفرما	Disaster Recovery

تحويل عملیاتی

- Pipeline ساخت و استقرار و سیاست approval برای Production
- تنظیمات محیطی و مدیریت Secret بدون وابستگی به نسخه نرم‌افزار
- Migration دیتابیس با امکان پایش و Rollback برنامه‌ریزی‌شده
- Dashboard‌های سلامت سرویس، دیتابیس، job، queue و provider
- Runbook رخداد، بازیابی، failover provider و عملیات دستی مجاز
- آموزش تیم عملیات، مالی، پشتیبانی و مدیر سامانه

مهاجرت داده

دامنه و کیفیت داده سامانه فعلی باید در فاز شناخت ارزیابی شود. پیشنهاد شامل طراحی mapping، اجرای dry run، گزارش مغایرت و یک اجرای نهایی است. پاک‌سازی گسترده داده، اصلاح سوابق ناقص و مهاجرت از منابعی که ساختار آن‌ها در زمان پیشنهاد مشخص نیست، نیازمند برآورد جداگانه خواهد بود.

۱۱ پشتیبانی و سطح خدمت

دوره ضمانت

سه ماه رفع اشکال پس از راه اندازی Production در مبلغ پیاده سازی منظور شده است. ضمانت شامل رفع مغایرت با نیازمندی و معیار پذیرش مصوب است و توسعه قابلیت جدید، تغییر مقررات، تغییر API provider یا افزایش ظرفیت زیرساخت را شامل نمی شود.

بسته های پشتیبانی پس از ضمانت

هزینه ماهانه	پوشش	بسته
۵۰۰ میلیون تومان	روزهای کاری ۸ تا ۱۷، مانیتورینگ و رسیدگی به رخداد	استاندارد ۸ در ۵
۸۵۰ میلیون تومان	On Call شبانه روزی برای رخداد بحرانی و پوشش عملیاتی	حیاتی ۲۴ در ۷
برآورد جداگانه	تیم ظرفیت رزرو شده برای roadmap و بهبود مستمر	توسعه مستمر

اهداف پاسخ گویی بسته استاندارد

هدف رفع یا راهکار موقت	زمان پاسخ	تعریف	اولویت
۴ ساعت کاری	۳۰ دقیقه	توقف سرویس یا ریسک مالی فعال	P1
۱ روز کاری	۲ ساعت کاری	اختلال جدی بدون توقف کامل	P2
۳ روز کاری	۱ روز کاری	اختلال محدود با راهکار جایگزین	P3
نسخه برنامه ریزی شده	۲ روز کاری	درخواست کم اثر یا بهبود	P4

SLA نهایی باید ساعات خدمت، پنجره نگهداری، مسئولیت زیرساخت و providerهای ثالث، نحوه اندازه‌گیری و service credit را مشخص کند.

پشتیبانی در مدل مشارکت در کارمزد

در صورت انتخاب مدل مشارکتی بخش ۱۲، پشتیبانی استاندارد ۸ در ۵ در کل دوره مشارکت جزو تعهد پیمانکار است و هزینه جداگانه‌ای ندارد. کارفرما در هر ماه مکلف است مبلغ بیشتر از میان سهم کارمزدی پیمانکار و حداقل پرداخت تضمین‌شده را بپردازد؛ بنابراین نبود فروش، کاهش تراکنش یا عدم وصول کارمزد از مشتریان، تعهد پرداخت حداقل تضمین‌شده را ساقط یا معلق نمی‌کند. ارتقای خدمت به پوشش حیاتی ۲۴ در ۷ با افزایش کف تضمین‌شده یا پرداخت مابه‌التفاوت بسته حیاتی انجام می‌شود.

۱۲ پیشنهاد مالی

مدل اول پرداخت ثابت

مبلغ تومان	شرح
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قیمت پایه طراحی توسعه استقرار و انتقال دانش
-۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تخفیف آغاز همکاری
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ خالص پیشنهادی اجرای نسخه عملیاتی

مالیات و عوارض قانونی به مبلغ فوق افزوده می‌شود. هزینه زیرساخت، تجهیزات، لایسنس، پیامک، eKYC، امضای دیجیتال، سرویس‌های استعلامی، HSM و تست نفوذ شرکت ثالث در مبلغ فوق منظور نشده است.

برنامه پرداخت

مبلغ تومان	درصد	رویداد پرداخت
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد	امضای قرارداد و ابلاغ شروع
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد	تأیید Scope baseline و معماری تفصیلی
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد	تحويل زیرساخت پلتفرم و هویت

مبلغ تومان	درصد	رویداد پرداخت
۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵ درصد	تحويل هسته درخواست تسهیلات و Integration
۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵ درصد	تحويل Merchant Transaction Settlement
۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵ درصد	استقرار Production و شروع پایش
۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵ درصد	پذیرش نهایی و انتقال دانش

مدل دوم مشارکت در کارمزد با حداقل تضمین شده

این مدل با هدف هم‌راستا کردن منافع طرفین و تأمین پایدار هزینه نگهداری پیشنهاد می‌شود. ارقام زیر پیشنهاد اولیه تجاری است و پس از دریافت پیش‌بینی حجم فروش، نرخ کارمزد و سناریوی رشد، در قرارداد نهایی تثبیت خواهد شد.

موضوع	شرط پیشنهادی
پرداخت اجرای اولیه	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان معادل ۵۰ درصد مبلغ خالص اجرا که متناسب با milestoneهای برنامه پرداخت مدل ثابت پرداخت می‌شود
سهم کارمزدی پیمانکار	۱۵ درصد از خالص کارمزد قابل تقسیم که در هر ماه واقعاً توسط کارفرما یا شرکت‌های وابسته و عاملان وصول دریافت شده است
حداقل پرداخت تضمین شده	۸۵۰ میلیون تومان در ماه؛ کارفرما مکلف است مبلغ بیشتر از میان سهم کارمزدی محاسبه شده و این کف را بپردازد
دوره مشارکت	۳۶ ماه از نخستین ماه کامل پس از راه‌اندازی Production
خدمت مشمول مشارکت	پشتیبانی استاندارد ۸ در ۵، مانیتورینگ و رسیدگی به رخداد در دوره مشارکت بدون صورتحساب ماهانه جداگانه

موضوع	شرط پیشنهادی
تسویه و گزارش‌دهی	تسویه ماهانه حداکثر تا دهمین روز کاری ماه بعد همراه با گزارش فروش، کارمزد، کسورات، برگشت‌ها و مغایرت‌ها

خالص کارمزد قابل تقسیم عبارت است از کارمزد خدمات و تراکنش‌های موفق سامانه که وصول قطعی شده، پس از کسر مالیات و عوارض، برگشت وجه، chargeback، سهم بانک یا PSP، هزینه providerهای ثالث و کسورات الزامی قانونی. اصل تسهیلات، سود و وجه تسویه پذیرنده جزو مبنای کارمزد نیست. حداقل تضمین‌شده مستقل از میزان فروش و وصول کارمزد است و در ماه بدون فروش نیز به طور کامل پرداخت می‌شود.

کارفرما باید دسترسی برخط یا گزارش قابل حسابرسی از تراکنش‌ها، کارمزدها و اسناد تسویه را در اختیار پیمانکار بگذارد. در صورت تأخیر در ارائه گزارش، مبلغ حداقل تضمین‌شده در سررسید پرداخت می‌شود و تعدیل سهم واقعی پس از دریافت گزارش در صورتحساب بعدی انجام خواهد شد. مدل ثابت و مدل مشارکتی جایگزین یکدیگرند و انتخاب هر مدل باید صریحاً در قرارداد درج شود.

اعتبار و تعدیل

- اعتبار این پیشنهاد ۳۰ روز تقویمی از تاریخ ارائه است
- تأخیر کارفرما بیش از ۳۰ روز در دسترسی، تصمیم یا پرداخت موجب بازبرنامه‌ریزی می‌شود
- عبور پروژه از سال مالی یا تأخیر خارج از کنترل پیمانکار، مشمول تعدیل مورد توافق خواهد بود
- هر تغییر خارج از Scope baseline با Change Request و برآورد زمان و مبلغ اجرا می‌شود

۱۳ مفروضات و موارد خارج از محدوده

مفروضات اصلی

- کارفرما قرارداد و دسترسی Sandbox یا Test همه providerهای لازم را فراهم می‌کند
- APIهای بانک، eKYC، امضای دیجیتال و پرداخت دارای مستندات و پشتیبانی فنی قابل دسترسی هستند
- تصمیم‌های Product Owner حداکثر ظرف سه روز کاری اعلام می‌شود
- زیرساخت اجرا، شبکه، دامنه، گواهی و دسترسی‌های امنیتی طبق برنامه تأمین می‌شود
- محتوا و متن حقوقی قراردادها و رضایت‌نامه‌ها توسط کارفرما تأیید می‌شود
- یک زبان رابط کاربری و یک واحد پول اصلی در نسخه مبنا پشتیبانی می‌شود

تعهدات کارفرما برای محیط و زیرساخت

- کارفرما باید محیط‌های UAT، Test، Development و Production و در صورت توافق محیط Pre Production و Disaster Recovery را مطابق برنامه پروژه ایجاد و در اختیار تیم پیمانکار قرار دهد.
- سرورها یا منابع پردازشی، فضای ذخیره‌سازی، پایگاه داده، queue، cache، فضای فایل و object storage و زیرساخت پشتیبان‌گیری مورد نیاز هر محیط توسط کارفرما تأمین می‌شود و باید با ظرفیت و معماری مصوب سازگار باشد.
- دسترسی امن و پایدار اعضای معرفی‌شده پیمانکار به محیط‌ها، مخازن کد و pipeline، artifact، لاگ‌ها، مانیتورینگ و ابزارهای عیب‌یابی از طریق bastion، VPN یا سازوکار امنیتی مورد توافق فراهم می‌شود.
- شبکه، IP و DNS، allowlist، دامنه، گواهی Secret، load balancer، WAF، firewall، TLS، کلیدها و مجوزهای اتصال به بانک و providerهای ثالث توسط کارفرما یا با همکاری واحدهای ذی‌ربط آن تأمین و تمدید می‌شود.
- کارفرما مسئول تأمین قرارداد، حساب کاربری، اعتبار مصرفی و دسترسی Test، Sandbox و Production سرویس‌های بیرونی و معرفی مسئول فنی پاسخ‌گو برای هر provider است.
- داده آزمون مجاز، سناریوهای UAT و نمایندگان کسب و کار، عملیات، مالی، امنیت و زیرساخت در زمان‌های مورد نیاز پروژه توسط کارفرما فراهم می‌شوند.
- تأخیر یا محدودیت در تأمین هر یک از محیط‌ها، سرورها، دسترسی‌ها، داده‌ها یا سرویس‌های فوق که مانع کار تیم شود، تأخیر مجاز محسوب و موجب بازبرنامه‌ریزی زمان و در صورت تحمیل هزینه، صدور Change Request خواهد شد.
- پیمانکار مسئول نصب، پیکربندی و استقرار اқلام داخل محدوده روی زیرساخت تحویلی است؛ مالکیت، هزینه و عملیات پایه زیرساخت و سرویس‌های ثالث بر عهده کارفرما باقی می‌ماند مگر آنکه در پیوست جداگانه خلاف آن توافق شود.

موارد خارج از مبلغ پایه

- هزینه مصرف یا راه‌اندازی سرویس‌های بیرونی و کارمزد تراکنش
- خرید سرور، تجهیزات شبکه، WAF، HSM و لایسنس محصولات تجاری

- تولید اپلیکیشن Native مستقل Android و iOS مگر آنکه در Scope نهایی افزوده شود
- پیاده‌سازی کامل کیف پول، BNPL، جت کارت، CRM، Loyalty و وصول مطالبات
- اخذ مجوز، تأییدیه حقوقی یا امنیتی از نهادهای بیرونی
- مهاجرت یا پاک‌سازی داده خارج از mapping تأییدشده
- تغییرات ناشی از مقررات جدید پس از تثبیت Scope

۱۴ ریسک‌ها و کنترل تغییرات

ریسک	اثر	اقدام کنترلی
نامشخص بودن API provider	تأخیر و بازکاری	API inventory در فاز شناخت، mock و contract test
عدم پایداری سرویس بیرونی	اختلال سفر مشتری	تعریف circuit breaker و substitute provider
رشد Scope	افزایش زمان و هزینه	کمیت‌ه تغییر و برآورد پیش از اجرا
کیفیت پایین داده مهاجرت	خطای مالی یا عملیاتی	تحلیل داده، dry run و reconciliation
ضعف تنظیمات یا کد	رخداد امنیتی	Security gate و تست نفوذ پیش از Go Live
تکرار تراکنش یا تسویه	زیان مالی	Idempotency، Ledger trail و کنترل چهارچشمی
برآورد نادرست بار	افت کارایی	ظرفیت‌سنجی و تست بار تدریجی
تأخیر تصمیم کارفرما	توقف تیم	تصمیم‌مکتوب Product Owner و SLA پاسخ

فرایند تغییر

- ۱ ثبت درخواست تغییر و دلیل کسب و کاری
- ۲ تحلیل اثر روی معماری، امنیت، زمان، هزینه و پذیرش
- ۳ ارائه پیشنهاد تغییر و اولویت اجرا
- ۴ تأیید کتبی نمایندگان مجاز طرفین
- ۵ به‌روزرسانی backlog، برنامه انتشار و مبنای مالی

۱۵ شرایط قراردادی پیشنهادی

- مالکیت سورس اختصاصی پروژه پس از تسویه کامل مطابق قرارداد به کارفرما منتقل می‌شود. اجزای عمومی و ابزارهای از پیش موجود پیمانکار با مجوز استفاده دائمی در اختیار پروژه قرار می‌گیرند.
 - طرفین تعهد محرمانگی و ضوابط دسترسی به داده‌های واقعی را پیش از دسترسی تیم امضا می‌کنند.
 - تعهدات امنیتی، محل نگهداری داده، سیاست لاگ و نحوه استفاده از داده Production در پیوست امنیت تعیین می‌شود.
 - مسئولیت عملکرد سرویس‌های ثالث، شبکه و زیرساختی که تحت کنترل پیمانکار نیستند از SLA پیمانکار تفکیک خواهد شد.
 - سقف مسئولیت، موارد استثنا، خسارت مستقیم و نحوه رسیدگی به رخداد مالی باید صریحاً در قرارداد تعیین شود.
 - فسخ، تعلیق، تأخیر پرداخت، تحویل سورس و انتقال دانش براساس milestone تکمیل‌شده تسویه می‌شود.
 - رزومه افراد کلیدی، فهرست پیمانکاران فرعی احتمالی و سطح دسترسی هر نقش پیش از شروع تأیید می‌شود.
 - در مدل مشارکت در کارمزد، تعهد کارفرما به پرداخت حداقل تضمین‌شده تعهد مستقل قراردادی است و به میزان فروش، عملکرد بازاریابی، تعداد تراکنش یا وصول کارمزد از اشخاص ثالث مشروط نیست.
 - کارفرما حق دسترسی پیمانکار به گزارش‌ها و اسناد لازم برای محاسبه و حسابرسی سهم کارمزدی را فراهم می‌کند و سازوکار رسیدگی به مغایرت، مهلت تسویه و ضمانت اجرای تأخیر در قرارداد درج می‌شود.
- این بخش جایگزین بررسی حقوقی قرارداد نیست. متن نهایی باید توسط مشاوران حقوقی و امنیتی طرفین بازبینی شود.

۱۶ گام‌های شروع پروژه

۱ تکمیل نام و اطلاعات ثبتی طرفین و تعیین نمایندگان مجاز

۲ امضای NDA و تبادل اسناد فنی و قراردادهای providerها

۳ برگزاری کارگاه Scope با نمایندگان کسب و کار، عملیات، مالی، امنیت و فناوری

۴ تأیید Scope baseline، اولویت انتشار و معیارهای پذیرش

۵ تأمین محیط‌ها، دسترسی‌ها و داده آزمون

۶ امضای قرارداد اجرایی و واریز پیش‌پرداخت

۷ آغاز iteration اول و ارائه گزارش هفتگی

اقدام مورد نیاز برای نهایی‌سازی

مالک تهیه	وضعیت	قلم
کارفرما	نیازمند تکمیل	نام رسمی و اطلاعات ثبتی کارفرما
پیشنهاددهنده	نیازمند تکمیل	نام رسمی شرکت پیشنهاددهنده و صاحبان امضا
کارفرما	نیازمند دریافت	فهرست providerها و قراردادهای فعال
مشترک	فاز شناخت	Scope نسخه اول و اولویت roadmap
مشترک	فاز شناخت	معیارهای NFR و SLA نهایی
پیشنهاددهنده	پیش از قرارداد	رزومه اعضای کلیدی و برنامه تخصیص

پیوست الف فهرست تحویل دادنی‌ها

گروه	شرح
تحلیل	سند Scope baseline و Requirements Traceability Matrix
معماری	مدل دامنه، Context Map و Architecture Decision Records
نرم‌افزار	سورس‌کد، migrationها، تست‌ها و pipelineها
API	OpenAPI تفکیک‌شده برای دامنه‌ها و نمونه فراخوانی
Integration	تنظیمات runtime، راهنمای Secret و certificate
کیفیت	Test plan، گزارش تست و فهرست ایرادهای رفع‌شده
عملیات	runbook و Deployment guide، rollback plan
مانیتورینگ	Dashboard و alertهای توافق‌شده
آموزش	راهنمای کاربر پنل و محتوای آموزش
پذیرش	Release note، صورت‌جلسه UAT و تحویل نهایی

پیوست ب فرهنگ واژگان

واژه	تعریف در این پیشنهاد
Product	خانواده تجاری محصولات اعتباری
Plan	پیشنهاد قابل انتخاب مشتری با قواعد و هزینه مشخص

واژه	تعریف در این پیشنهاد
Control	قاعده احراز طرح مانند سن یا حداقل رتبه اعتباری
Inquiry	دریافت Fact از سرویس بیرونی بدون تصمیم‌گیری درباره طرح
Origination	چرخه درخواست مشتری از انتخاب طرح تا تخصیص اعتبار
Fee Obligation	ثبت الزام پرداخت یک هزینه مشخص
Facility Allocation	اختصاص اعتبار تأییدشده در سرویس مالی بیرونی
Reconciliation	مقایسه و تطبیق سوابق تراکنش داخلی و provider
Settlement	محاسبه و پرداخت سهم پذیرنده در یک دوره
RPO	هدف نقطه بازیابی داده
RTO	هدف زمان بازیابی خدمت

منابع

- راهنمای مراحل درخواست تسهیلات در سامانه جت وام به عنوان وضعیت جاری
- ویدئوی سفر مشتری جت وام مرداد ۱۴۰۵ به عنوان وضعیت جاری
- سند نیازمندی‌های سامانه جت وام خرداد ۱۴۰۵ به عنوان نقشه راه
- مستندات معماری و Context Map کدبیس جت وام
- تعرفه پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سال ۱۴۰۴ برای مبنای روش قیمت‌گذاری و پشتیبانی
- گزارش‌های حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ برای کنترل معقول بودن هزینه تیم

پایان سند
